

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 21/08/2024 14:11:54

Date : 21/08/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : AVENIR PLUS

id client : 775

id agence : S100

id societe : 700

ville : NIMES

Code postal : 30900

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID01

Localisation site client :

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : manuel

Annee : Anneee

N° de série : Série

Marque : Marque

Largeur (baie pour les portes) : Largeur

Hauteur (baie pour les portes) : Hauteur

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer

Type de lame à remplacer : Finale

Nombre de lame à remplacer : 1

Forme lame finale à remplacer : 38

Largeur dos de coulisse lame finale : 25

Présence serrure sur lame finale : Non

Finition lame finale laquée : Non

Type raidisseur : Equerre

Type enroulement : Exterieur

Photo environnement équipement :



Prise le 21/08/2024 14:11:26

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :

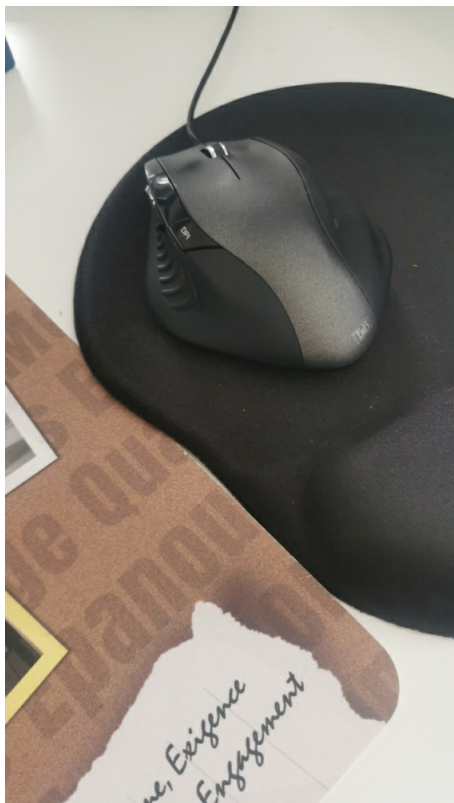

Prise le 21/08/2024 14:11:39

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : Med

Signature tech :

✓
