

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 16/10/2024 08:22:36

**Date :** 15/10/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SDIS LEDIGNAN

**ville :** LEDIGNAN

**Code postal :** 30350

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Mischler

**Largeur (baie pour les portes) :** 3800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 8400

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 15/10/2024 14:09:23

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 15/10/2024 13:56:16

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2005

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ligne arbre** : 8400

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 15/10/2024 14:07:18

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** : rajouter de la chaîne au moteur. trop court. (environ 3 mètres).

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement** :



Prise le 15/10/2024 14:01:22



Prise le 15/10/2024 14:04:23

---

**Equipement** : RAP01

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 4000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3500

**Plaque signalétique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** : toile transparente hublot de la bâche déchirer.largeur 460 x 310.

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1h00


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:21:52

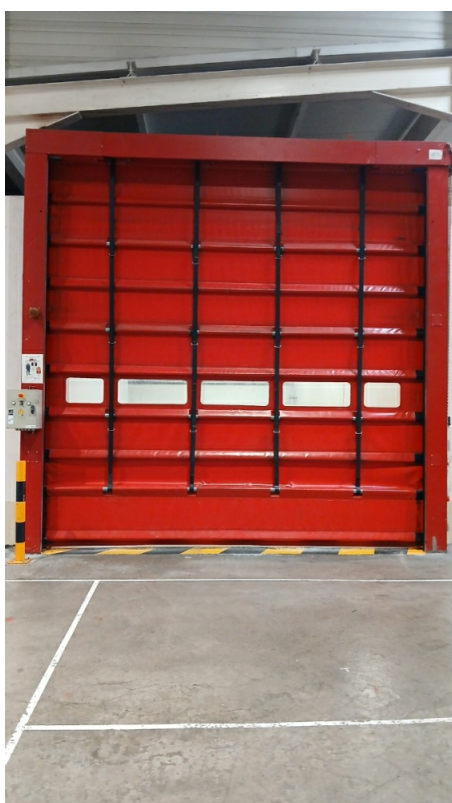


Prise le 15/10/2024 14:22:44





Prise le 15/10/2024 14:23:16

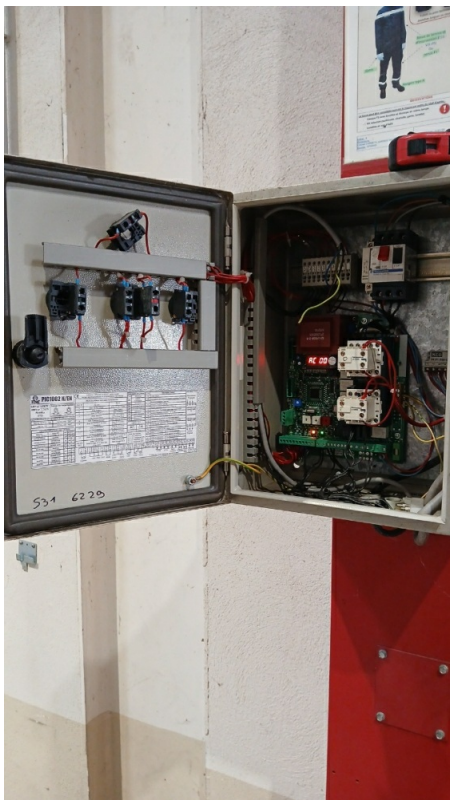

Prise le 15/10/2024 14:23:32

**Equipement** : RAP02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque :** Mischler

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 15/10/2024 14:28:35

---

**Equipement :** PEX02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 3960

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1850

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**



**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 15/10/2024 14:39:08



Prise le 15/10/2024 14:40:15

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4960

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1870

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Eclairage de zone à remplacer

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h00

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 15/10/2024 14:47:37

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jde

Signature tech :
