# **Visite maintenance GRENOBLE**

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 23/09/2024 16:56:09

Date: 23/09/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### Localisation site

Nom client: LA TURBINE A SAVEURS

ville: ST ALBAN DE ROCHE

Code postal: 38300

#### **PARC SOUS CONTRAT**

### **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: TEL01

Localisation site client :

**NATURE**: Table elevatrice

Mode fonctionnement : motorisé

**Annee**: 2020

N° de série : CC2000006

Marque: SYSTEM DOCK

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/09/2024 11:40:14

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

**Anomalie / composant autres :** garde corp légèrement tordu ne dérange pas le bon fonctionnement

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

Photo équipement :



Prise le 23/09/2024 11:41:06



Prise le 23/09/2024 11:41:32

**Equipement**: PEX01

**Localisation site client**:

**NATURE**: Portail

Mode fonctionnement: automatique

**Annee**: 2020

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

 $\textbf{Hauteur (baie pour les portes)}: \mathsf{A}\ \mathsf{RENSEIGNER}$ 

Plaque signaletique : non

**Type portail**: Coulissant

Anomalie portails : Eclairage de zone à remplacer

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir


Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 



Prise le 23/09/2024 14:29:36



Prise le 23/09/2024 14:29:56

**Equipement**: PPV01

Localisation site client :

**NATURE** : Porte pietonne

Mode fonctionnement: automatique

**Annee**: 2020

N° de série : 20300021

Marque: MANUSA

Largeur (baie pour les portes): 2000

Hauteur (baie pour les portes): 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/09/2024 14:42:46

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

**Anomalie PPV CFE:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :**  $\lor$ 



Prise le 23/09/2024 14:43:43

**Equipement**: RAP01

Localisation site client :

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2020

N° de série: AZ20-853


Marque: GLG

Largeur (baie pour les portes): 2000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : oui

# Photo plaque:




Prise le 23/09/2024 15:02:16

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 23/09/2024 15:03:14



Prise le 23/09/2024 15:03:43

# Anomalie / composant autres :

**Etat** : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 

# Photo équipement :



Prise le 23/09/2024 15:04:57

Equipement: COF01

Localisation site client :

**NATURE**: Porte frigorifique

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2020

N° de série: 2005019500201

Marque: COOL IT

Largeur (baie pour les portes): 2000

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:




Prise le 23/09/2024 15:06:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 2000

# Photo marquage au sol:



Prise le 23/09/2024 15:07:19

#### Anomalie / composant autres :

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 


# Photo équipement :



Prise le 23/09/2024 15:08:28



Prise le 23/09/2024 15:08:36



Prise le 23/09/2024 15:08:43

**Equipement**: COF03

Localisation site client :

**NATURE**: Porte frigorifique

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2020

N° de série : 2005027500301

Marque : COOL IT

Largeur (baie pour les portes): 1000

Hauteur (baie pour les portes): 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:




Prise le 23/09/2024 15:10:06

**Présence faux plafond** : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 1000

Photo marquage au sol :

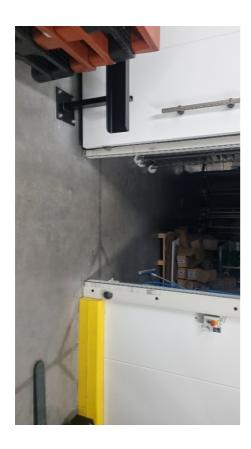

Prise le 23/09/2024 15:13:25

# Anomalie / composant autres :

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jjour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 



Prise le 23/09/2024 15:15:37



Prise le 23/09/2024 15:19:10

**Equipement**: COF02

 ${\bf Localisation\ site\ client:}$ 

**NATURE**: Porte frigorifique

Mode fonctionnement: automatique

**Annee**: 2020

N° de série: 2005019500101

Marque : COOL IT

Largeur (baie pour les portes): 2000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 23/09/2024 15:16:35

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 2000

Photo marquage au sol :



Prise le 23/09/2024 15:17:08

# Anomalie / composant autres :

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 



Prise le 23/09/2024 15:17:58



Prise le 23/09/2024 15:18:05

# **Equipement supplémentaire**

#### Commentaire interne:

**TRIGRAMME**: jle mpaj

# Signature tech :

