Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER **Prénom:** SOMAFI

Date de réponse : 26/09/2024 15:54:03

Date: 19/09/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

ballsel la zolle avec des colles

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: COLAS

ville: SAINT JEAN DE VEDAS

Code postal: 34490

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client :

NATURE: Portail

Mode fonctionnement: semi automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 6800

Hauteur (baie pour les portes): 2600

Plaque signaletique : non

Type portail: Coulissant

Anomalie portails : Feu clignotant à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Usure du marquage au sol, Barre

palpeuse à remplacer

Modèle barre palpeuse : mécanique **Modèle feu clignotant** : standard

photo marquage au sol:



Prise le 19/09/2024 09:46:19

Anomalie / composant autres : manque 30 cm parti basse du palpeur embarqué sécurités fermeture

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : photos

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 09:50:10

Equipement: BLE01

Localisation site client:

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER



Prise le 19/09/2024 09:56:18

Anomalie BLE:

Anomalie / composant autres : marquage à faire , lisse trop courte n,atteind pas le poteau de réception LG 6150 avec 6 feux led clignotants

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ${\sf R}$

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 10:06:38

Equipement: PEX02

Localisation site client:

NATURE: Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:




Prise le 19/09/2024 10:43:50

Type portail: Coulissant

Anomalie portails : Barre palpeuse à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Usure du marquage au sol

Modèle barre palpeuse : mécanique , sécurité à l,ouverture, LG 1400

photo marquage au sol:

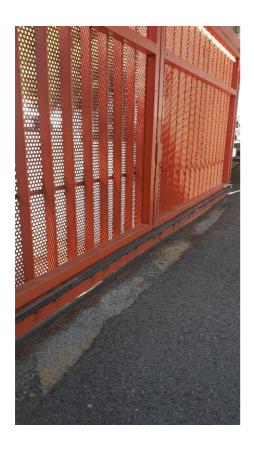

Prise le 19/09/2024 10:45:06

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

 $\textbf{rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE:} \ R$

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 10:47:06

Equipement: SEC01

Localisation site client:

 $\textbf{NATURE}: Porte\ sectionnelle$

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4200

Hauteur ligne arbre : 7300



Prise le 19/09/2024 11:09:22


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon

fonction nement

Localisation choc tablier: Panneau bas

Photo choc tablier:



Prise le 19/09/2024 11:10:35

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : $8\ M$

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 11:11:49

Equipement: SEC02

Localisation site client:

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4200

Hauteur ligne arbre: 7300



Prise le 19/09/2024 11:17:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 11:18:21

Equipement: SEC03

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4200

Hauteur ligne arbre: 7300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 19/09/2024 11:23:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 11:24:21

Equipement: SEC04

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4200

Hauteur ligne arbre : 7300



Prise le 19/09/2024 11:27:15

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat: Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 19/09/2024 11:28:08

Equipement supplémentaire

Commentaire interne: photos

TRIGRAMME: ejo

Signature tech :

