

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 11/09/2024 14:47:31

**Date :** 11/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LOCAKASE ST EGREVE

**ville :** ST EGREVE

**Code postal :** 38120

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes ) : 3000**

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique : non**

**Présence faux plafond : oui**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Feu clignotant à remplacer**

**Modèle feu clignotant :**

**Longueur marquage au sol : 3500**

**Photo marquage au sol :**



Prise le 11/09/2024 11:24:33

**Anomalie / composant autres : marquage au sol à revoir**

**Etat : Travaux obligatoires**

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h**


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 11/09/2024 10:37:29

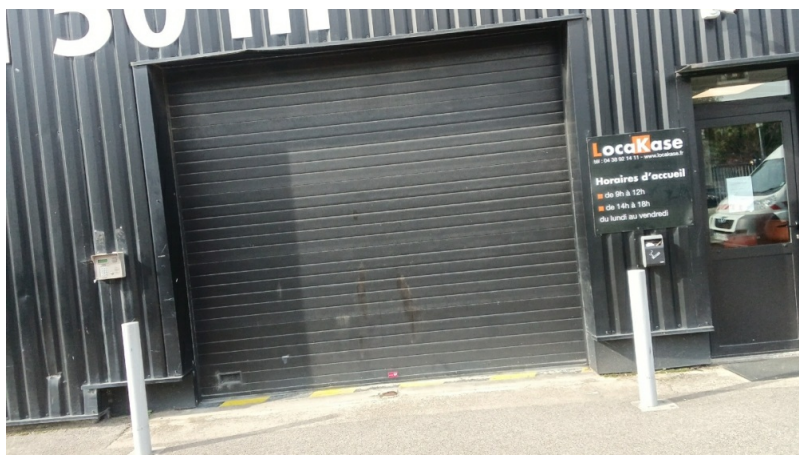

Prise le 11/09/2024 10:38:06

---

**Équipement :** SEC02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 3495

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signalétique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer, Joint à remplacer

**Longueur marquage au sol :** 3495

**Photo marquage au sol :**



Prise le 11/09/2024 10:45:29

**Type de joint :** Vertical

**Marque joint :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 11/09/2024 10:46:41

---

**Equipement :** SEC03



**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 11/09/2024 10:51:43

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** CEPsIV40111709574 CNV-1017-13005

**Marque :** ISEA

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ligne arbre :**

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**




Prise le 11/09/2024 10:59:08

**Présence faux plafond :** oui

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol :** 3500

**Photo marquage au sol :**

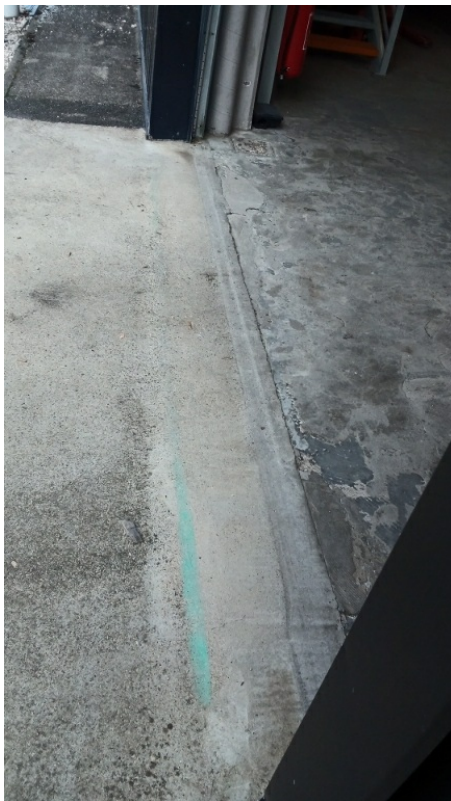

Prise le 11/09/2024 10:59:36

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 11/09/2024 10:56:11

---

**Equipement :** PEX02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** NICE

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1790

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Usure du marquage au sol

**photo marquage au sol :**



Prise le 11/09/2024 11:17:31

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R



**Photo équipement :**



Prise le 11/09/2024 11:18:13

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** NICE

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1773

**Plaque signalétique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Usure du marquage au sol

**photo marquage au sol :**



Prise le 11/09/2024 11:21:02

**Anomalie / composant autres :** grillage non conforme

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 11:22:06

## Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu/ jsa/ nsz

Signature tech :
