

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 21/08/2024 16:52:08

Date : 21/08/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : ADAPEI JANET

ville : ROMANS SUR ISERE

Code postal : 26100

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : C061467A

Marque : LUCIANO

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 21/08/2024 16:23:09

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Raidisseur à remplacer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 21/08/2024 16:25:11

Nombre de raidisseur : 1

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 3000

Anomalie / composant autres : tampon caoutchouc de moteur à chàger le moteur bouge anormalement a la monté et à la descente voir photo


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O


Photo équipement :

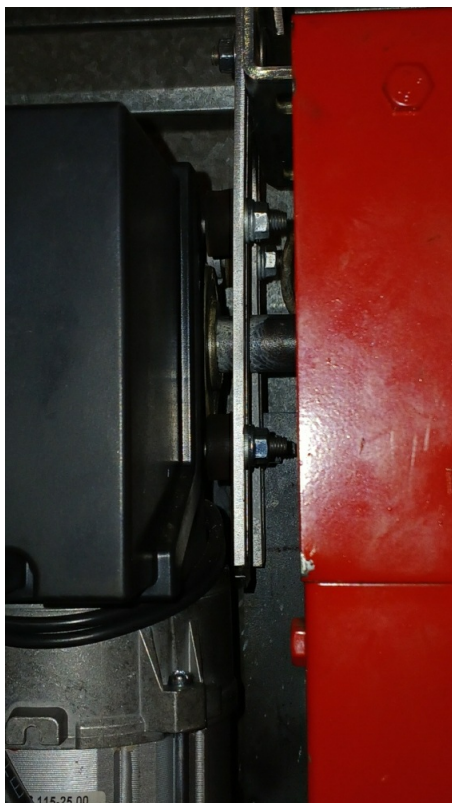

Prise le 21/08/2024 16:33:01

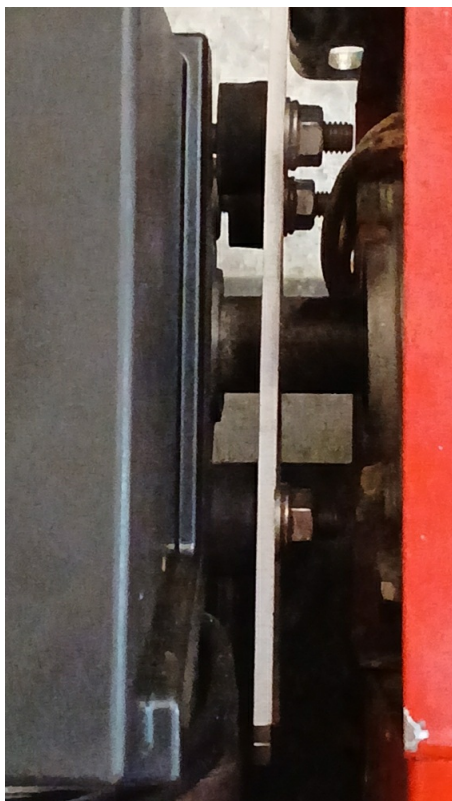

Prise le 21/08/2024 16:33:19

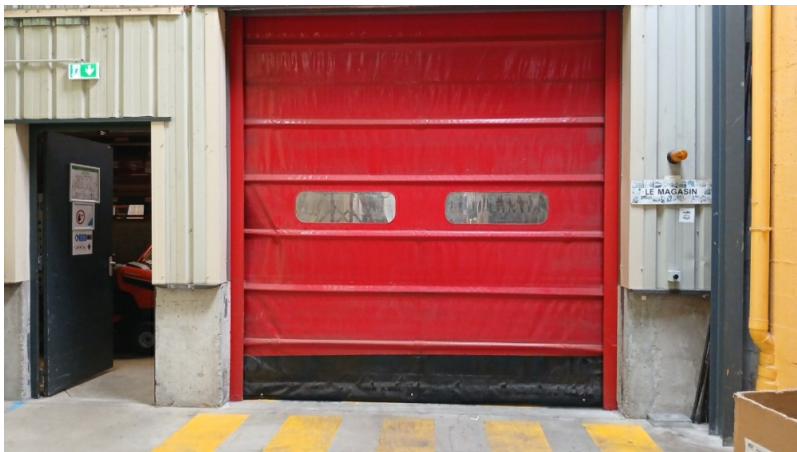

Prise le 21/08/2024 16:34:15



Prise le 21/08/2024 16:46:37

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : FCH mpaj

Signature tech :

MOKWOT

