

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 15/11/2024 12:30:59

Date : 15/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : PROLACTINE

ville : CHAMBERY

Code postal : 73000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2013

N° de série : POR13005255

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 1400

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 15/11/2024 11:45:57

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 1380

Photo marquage au sol :



Prise le 15/11/2024 11:47:26

Anomalie / composant autres : jeu sur le réducteur à surveiller.

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 15/11/2024 11:49:36

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2012

N° de série : POR12014951


Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1400

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :

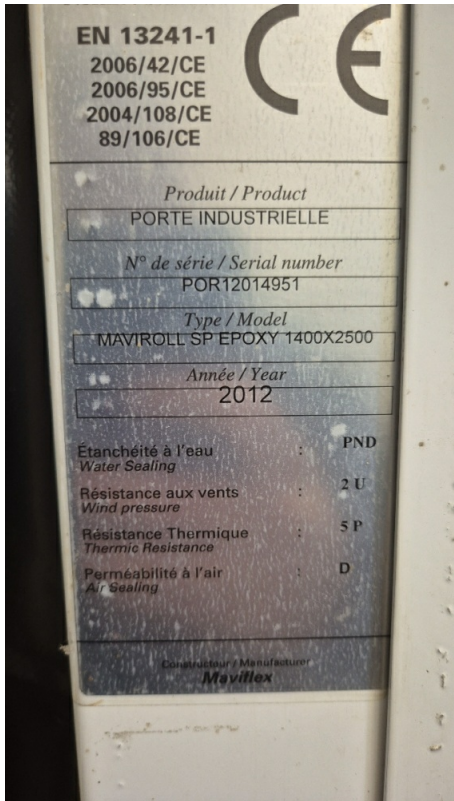

Prise le 15/11/2024 11:58:03

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 1380

Photo marquage au sol :



Prise le 15/11/2024 11:58:29

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 15/11/2024 12:00:05

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2012

N° de série : POR12014952


Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 2500

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :

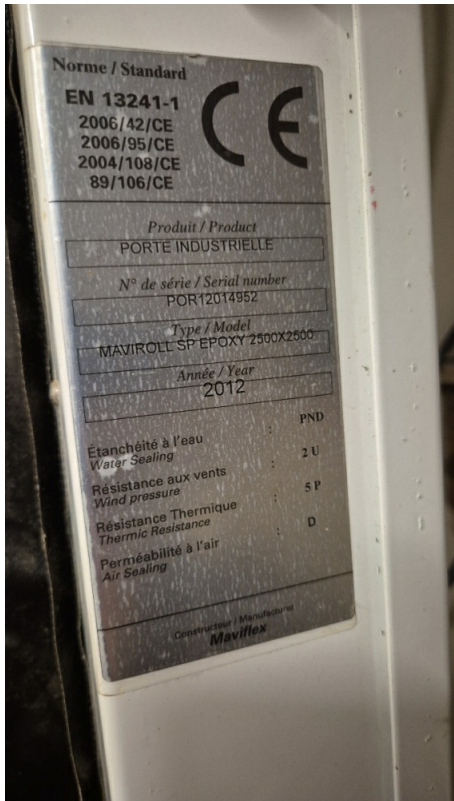

Prise le 15/11/2024 12:12:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 2500

Photo marquage au sol :



Prise le 15/11/2024 12:14:05

Anomalie / composant autres : cellule PB 10 palpeur à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 15/11/2024 12:13:35

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : MOL

Signature tech :
